



แนวทางปฏิบัติ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๙
สำหรับผู้ประกอบการ

สารบัญ

บทที่	หน้า
บทที่ ๑ การบังคับใช้	๑
บทที่ ๒ เงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ	๓
บทที่ ๓ ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้ประกอบการ	๕
บทที่ ๔ การระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ	๖
บทที่ ๕ การแก้ไขคะแนนความเสียหาย	๙

ภาคผนวก

ภาคผนวก กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

บทที่ ๑ การบังคับใช้


ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๙ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ใช้บังคับกับงานก่อสร้าง ดังนี้

๑. ลักษณะของงานก่อสร้างที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

(๑) งานก่อสร้างของกรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมทรัพยากรน้ำ กรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด ที่มีมูลค่าสัญญา ตั้งแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

(๒) งานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง สำหรับงานก่อสร้างประเภทอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หรืออาคารชุมนุมคน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร


(๓) งานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ที่มีมูลค่าสัญญาตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

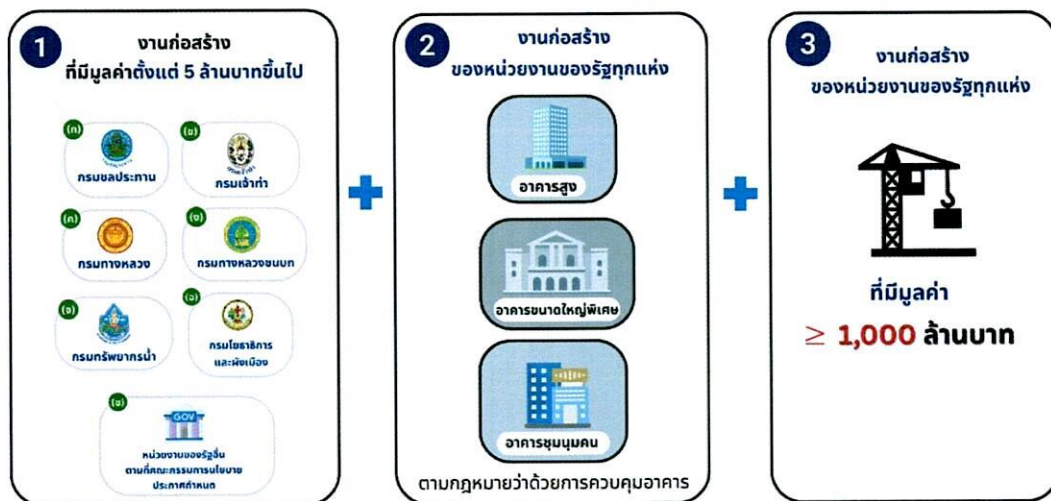

ทั้งนี้ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐจะต้องกำหนดไว้ในประกาศ และเอกสารเชิญชวน เพื่อให้ผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐทราบเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย

๒. ลักษณะของสัญญาจ้างก่อสร้างหรือโครงการจ้างก่อสร้างที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

๒.๑ สัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและสัญญายังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ หรือยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ให้ใช้บังคับเฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานของหลักวิชาช่างในงานก่อสร้างหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง อันมีผลกระทบให้มีบุคคลถึงแก่ความตาย หรือได้รับอันตรายสาหัส หรือทรัพย์สินเสียหาย หรือกระทบต่อการจราจร หรือความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ

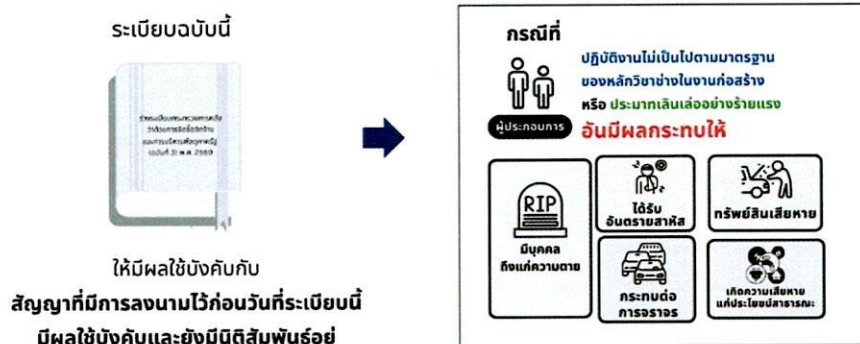

๒.๒ โครงการจ้างก่อสร้างที่มีผลใช้บังคับ


๑) กรณีจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e - Bidding)

โครงการจ้างก่อสร้างที่มีลักษณะของงานก่อสร้างตามข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้ เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนบนระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) แล้ว ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการในขั้นตอนเดิมตามที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

๒) กรณีจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการจ้างก่อสร้างที่มีลักษณะของงานก่อสร้างตามข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้ เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้มีหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการแล้ว ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นดำเนินการในขั้นตอนเดิมตามที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป


โครงการจ้างก่อสร้างที่ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ ฉบับนี้

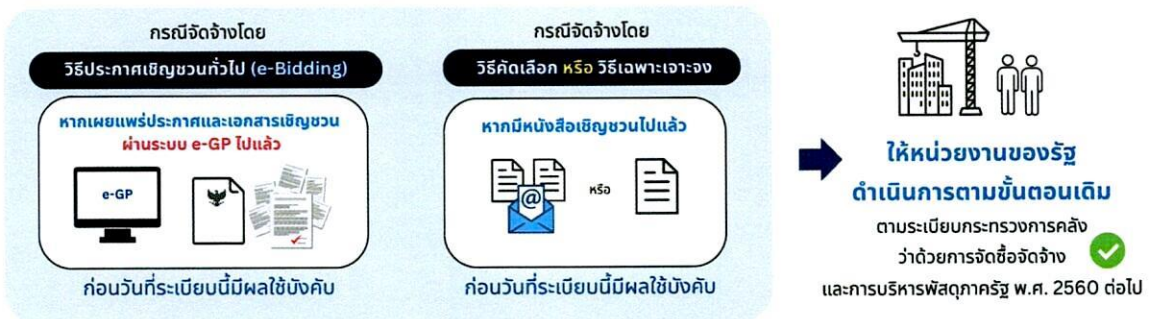

บทที่ ๒

เงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการจะแบ่งการประเมินออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ช่วงระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา จำนวน ๓ เงื่อนไข และช่วงระหว่างการรักษาประกันความชำรุดบกพร่อง จำนวน ๒ เงื่อนไข โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

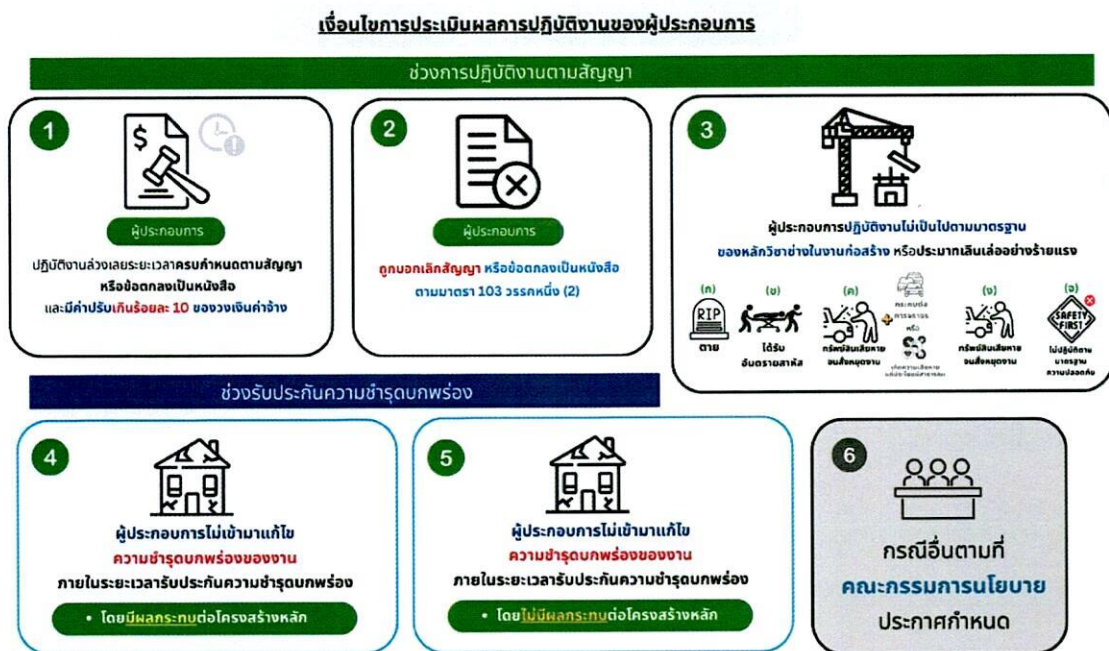

๑. การประเมินระหว่างช่วงการปฏิบัติงานตามสัญญา จำนวน ๓ เงื่อนไข มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ประกอบการปฏิบัติงานล่วงเลยระยะเวลาครบกำหนดตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือและมีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง ในกรณีนี้ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

(๒) ผู้ประกอบการถูกบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) ในกรณีนี้ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

(๓) ผู้ประกอบการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานของหลักวิชาช่างในงานก่อสร้าง หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันมีผลกระทบดังนี้

(ก) เหตุที่เกิดขึ้นมีผลกระทบทำให้มีบุคคลถึงแก่ความตาย

(ข) เหตุที่เกิดขึ้นมีผลกระทบทำให้มีบุคคลได้รับอันตรายสาหัส

(ค) เหตุที่เกิดขึ้นมีผลกระทบทำให้ทรัพย์สินเสียหายและหน่วยงานของรัฐได้สั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ชั่วคราวและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และส่งผลกระทบต่อการจราจรหรือเกิดความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ

(ง) เหตุที่เกิดขึ้นมีผลกระทบทำให้ทรัพย์สินเสียหายและหน่วยงานของรัฐได้สั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ชั่วคราวและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ในกรณีนี้ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

(จ) ผู้ประกอบการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานของหลักวิชาช่างในงานก่อสร้าง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยตามสัญญา ในกรณีนี้ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

๒. การประเมินระหว่างช่วงการรับประกันความชำรุดบกพร่อง จำนวน ๒ เดือน มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ประกอบการไม่เข้ามาดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง หรือเข้าแก้ไขแต่ดำเนินการล่าช้าหรือไม่แล้วเสร็จ โดยความชำรุดบกพร่อง กระทบต่อโครงสร้างหลัก อันเกิดจากผู้ประกอบการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่างในงานก่อสร้าง ในกรณีนี้ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

(ก) ผู้ประกอบการไม่เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา

(ข) ผู้ประกอบการไม่เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่พ้นระยะเวลามาตาม (ก)

เมื่อพ้นระยะเวลามาตาม (ข) ผู้ประกอบการไม่เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้ถูกต้องตามสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งคะแนนความเสียหายทุก ๓๐ วัน

(ค) ผู้ประกอบการเข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องแล้ว แต่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

(ง) ผู้ประกอบการไม่เข้ามาดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่อง หรือเข้าแก้ไขแต่ดำเนินการล่าช้าหรือไม่แล้วเสร็จ อันเป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องนั้นเอง หรือจ้างผู้ประกอบการอื่นเพื่อดำเนินการแก้ไขงานนั้น

(๒) ผู้ประกอบการไม่เข้ามาดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง หรือเข้าแก้ไขแต่ดำเนินการล่าช้าหรือไม่แล้วเสร็จ โดยความชำรุดบกพร่อง ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลัก อันเกิดจากผู้ประกอบการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่างในงานก่อสร้าง กรณีนี้ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

บทที่ ๓

ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้ประกอบการ

เมื่อผู้ประกอบการได้รับแจ้งผลการประเมินผ่านทางระบบ e - GP ผู้ประกอบการมีสิทธิอุทธรณ์โต้แย้งคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการไปยังหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญา ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมินผ่านทางระบบ e - GP ทั้งนี้ วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมินให้ถือตามวันเวลาของระบบ e - GP เป็นเกณฑ์ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๑) ให้ผู้ประกอบการอุทธรณ์โต้แย้งผลการประเมินโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ ระบุเหตุผลข้อเท็จจริงให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญา

๒) หน่วยงานของรัฐจะพิจารณาข้ออุทธรณ์โต้แย้งให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่รับข้ออุทธรณ์โต้แย้ง แบ่งเป็น ๓ กรณี ต่อไปนี้

๒.๑) กรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นด้วยกับข้ออุทธรณ์โต้แย้งทั้งหมดหรือบางส่วน หากไม่มีผลคะแนนความเสียหาย ผู้ประกอบการจะได้รับแบบแจ้งผลคะแนนความเสียหายผ่านหน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๒.๒) กรณีผู้ประกอบการอุทธรณ์โต้แย้งผลการประเมิน แต่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับข้ออุทธรณ์โต้แย้ง หรือเห็นด้วยกับข้ออุทธรณ์โต้แย้งทั้งหมดหรือบางส่วน และมีผลคะแนนความเสียหาย ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบประกาศคะแนนความเสียหายและผลคะแนนความเสียหายผ่านหน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th รวมทั้งจะได้รับแบบแจ้งผลคะแนนความเสียหายผ่านระบบ e - GP

๒.๓) กรณีผู้ประกอบการไม่อุทธรณ์โต้แย้งภายในระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนด ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบประกาศคะแนนความเสียหายและผลคะแนนความเสียหายผ่านหน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th รวมทั้งจะได้รับแบบแจ้งผลคะแนนความเสียหายผ่านระบบ e - GP

บทที่ ๔

การระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบผลคะแนนความเสียหายและผลคะแนนความเสียหายสะสมผ่านหน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หากผู้ประกอบการรายใดมีผลคะแนนความเสียหายสะสมอยู่ในเกณฑ์การถูกระงับ ผู้ประกอบการรายนั้นจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นับถัดจากวันที่ผลคะแนนความเสียหายสะสมอยู่ในเกณฑ์การถูกระงับ ตามบัญชีเอกสารแนบท้ายของระเบียบฯ ดังนี้

๔.๑ บัญชีเอกสารแนบท้าย กำหนดคะแนนความเสียหาย ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการและคะแนนความเสียหาย ตามข้อ ๑๔๐/๓

ที่	ความเสียหาย	คะแนนความเสียหาย
๑. ช่วงการปฏิบัติงานตามสัญญา		
(๑)	ผู้ประกอบการปฏิบัติงานล่วงเลยระยะเวลาครบกำหนดตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง	๓๐
(๒)	ผู้ประกอบการถูกบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒)	๖๐
(๓)	ผู้ประกอบการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานของหลักวิชาช่างในงานก่อสร้าง หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง อันมีผลกระทบดังนี้	
	(ก) เหตุที่เกิดขึ้นมีผลกระทบทำให้มีบุคคลถึงแก่ความตาย	๖๐
	(ข) เหตุที่เกิดขึ้นมีผลกระทบทำให้มีบุคคลได้รับอันตรายสาหัส	๓๐
	(ค) เหตุที่เกิดขึ้นมีผลกระทบทำให้ทรัพย์สินเสียหายและหน่วยงานของรัฐได้สั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ชั่วคราว และส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และส่งผลกระทบต่อการจราจร หรือเกิดความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ	๑๐
	(ง) เหตุที่เกิดขึ้นมีผลกระทบทำให้ทรัพย์สินเสียหายและหน่วยงานของรัฐได้สั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ชั่วคราว และส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน	๕
	(จ) กรณีปรากฏว่าผู้ประกอบการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานของหลักวิชาช่างในงานก่อสร้าง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยตามสัญญา	
	๑) ผู้ประกอบการไม่ดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายในระยะเวลาหน่วยงานของรัฐกำหนดตามหนังสือแจ้งให้แก้ไข	๑๐
	๒) ผู้ประกอบการไม่ดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่พ้นระยะเวลาตาม ๑)	๑๐
	เมื่อพ้นระยะเวลาตาม ๒) ผู้ประกอบการไม่ดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งคะแนนความเสียหายทุก ๓๐ วัน	๒๐

ที่	ความเสียหาย	คะแนนความเสียหาย
๒. ช่วงการรับประกันความชำรุดบกพร่อง		
(๔)	ผู้ประกอบการไม่เข้ามาดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง หรือเข้าแก้ไขแต่ดำเนินการล่าช้าหรือไม่แล้วเสร็จ โดยความชำรุดบกพร่องกระทบต่อโครงสร้างหลักอันเกิดจากผู้ประกอบการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่างในงานก่อสร้าง ดังนี้	
	(ก) ผู้ประกอบการไม่เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา	๑
	(ข) ผู้ประกอบการไม่เข้ามาดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้ถูกต้องตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่พ้นระยะเวลาดำเนินการ (ก)	๕
	เมื่อพ้นระยะเวลาดำเนินการ (ข) ผู้ประกอบการไม่เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้ถูกต้องตามสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งคะแนนความเสียหายทุก ๓๐ วัน	๕
	(ค) ผู้ประกอบการเข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องแล้ว แต่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด	๕
	(ง) ผู้ประกอบการไม่เข้ามาดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่อง หรือเข้าแก้ไขแต่ดำเนินการล่าช้าหรือไม่แล้วเสร็จ อันเป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องนั้นเอง หรือจ้างผู้ประกอบการอื่นเพื่อดำเนินการแก้ไขงานนั้น	๖๐
(๕)	ผู้ประกอบการไม่เข้ามาดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง หรือเข้าแก้ไขแต่ดำเนินการล่าช้าหรือไม่แล้วเสร็จ โดยความชำรุดบกพร่องไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักอันเกิดจากผู้ประกอบการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่างในงานก่อสร้าง	
	(ก) ผู้ประกอบการเข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องแล้ว แต่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด	๕
	(ข) ผู้ประกอบการไม่เข้ามาดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่อง หรือเข้าแก้ไขแต่ดำเนินการล่าช้าหรือไม่แล้วเสร็จ อันเป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องนั้นเอง หรือจ้างผู้ประกอบการอื่นเพื่อดำเนินการแก้ไขงานนั้นให้	๖๐

๔.๒ บัญชีเอกสารแนบท้าย กำหนดคะแนนความเสียหายสะสมและระยะเวลาการระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ที่	คะแนนความเสียหายสะสม	ระยะเวลาการระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
๑	๑ - ๙	-
๒	๑๐ - ๒๙	๓๐ วัน
๓	๓๐ - ๕๙	๙๐ วัน
๔	๖๐ - ๑๑๙	๑๘๐ วัน
๕	๑๒๐ - ๑๗๙	๓๖๐ วัน
๖	๑๘๐ - ๒๓๙	๕๔๐ วัน
๗	≥ ๒๔๐	๗๒๐ วัน

บทที่ ๕ การแก้ไขคะแนนความเสียหาย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการสามารถแก้ไขคะแนนความเสียหายได้


ในกรณีที่ผู้ประกอบการได้ฟ้องคดีต่อศาล ต่อมาศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าไม่ใช่ความผิดของผู้ประกอบการ ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ให้ผู้ประกอบการส่งสำเนาคำพิพากษาดังกล่าว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขคะแนนความเสียหาย

(๒) เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบประกาศแก้ไขคะแนนความเสียหายผ่านหน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th รวมทั้งจะได้รับแบบแจ้งแก้ไขคะแนนความเสียหายผ่านระบบ e - GP

การแก้ไขคะแนนความเสียหาย

กรณีที่ 1 ในกรณีที่ผู้ประกอบการได้ฟ้องคดีต่อศาล ต่อมาศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าไม่ใช่ความผิดของผู้ประกอบการ

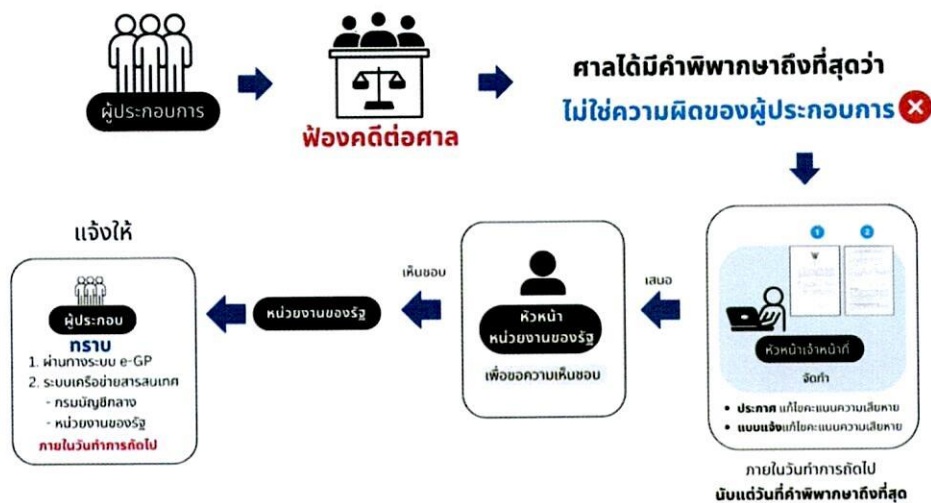

ภาคผนวก

ภาคผนวก	รายการ	QR CODE
๑	กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง	
๒	แบบแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการและคะแนนความเสียหาย (แบบ ปม. ๑)	
๓	แบบอุทธรณ์โต้แย้งผลการประเมิน (แบบ ปม. ๒)	
๔	แบบแจ้งผลคะแนนความเสียหาย (แบบ ปม. ๓)	
๕	แบบแจ้งแก้ไขคะแนนความเสียหาย (แบบ ปม. ๔)	
๖	ประกาศของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ และคะแนนความเสียหาย	
๗	ประกาศของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง การแก้ไขคะแนนความเสียหาย	
